



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

Mittente:

Prof. Ing. Stefano Orlandini
Commissario straordinario per la diga di Vetto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 – Roma (RM)
PEC: stefano.orlandini@pec.unimore.it

Destinatario:

Egregia Ing. Angelica Catalano
Responsabile, Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 – Roma (RM)
PEC: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

e, p.c.,

Egregia Ing. Elisabetta Pellegrini
Responsabile, Struttura Tecnica di Missione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 – Roma (RM)
PEC: segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it

Egregio Dott. Francesco Paolo Tronca
Responsabile, Osservatorio sui Commissariamenti Infrastrutturali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 – Roma (RM)
PEC: osserv.comm_infrastr@pec.mit.gov.it

Egregio Presidente Michele De Pascale
Presidente della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 – Bologna (BO)
PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

Egregio Presidente Lorenzo Catellani
Presidente, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
Corso Garibaldi, 42
42121 – Reggio Emilia (RE)
PEC: protocollo@pec.emiliacentrale.it

Egregia Dott.ssa Francesca Mantelli
Presidente, Consorzio della Bonifica Parmense

Sede istituzionale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, 00161 Roma
Sedi di supporto amministrativo: Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42, 42121 Reggio Emilia •
Consorzio della Bonifica Parmense, Via Marco Emilio Lepido 70, 43123 Parma
Mobile: +39 331 6213086 • E-mail: stefano.orlandini@unimore.it • PEC: stefano.orlandini@pec.unimore.it



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

Via Emilio Lepido, 70/1A
43123 – Parma (PR)
PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

Oggetto: Trasmissione del cronoprogramma delle attività commissariali per la diga di Vetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

(CUP: F13F22000170008)

Egregia Direttrice,

Con riferimento all'incarico di Commissario straordinario per la diga di Vetto, conferito con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si trasmette in allegato il cronoprogramma delle attività commissariali, corredato dai dati finanziari riscontrabili sul Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), presso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il cronoprogramma rappresenta la pianificazione delle principali fasi di progettazione e approvazione dell'intervento, con l'indicazione dei traguardi intermedi (*milestone*) e delle relative scadenze temporali. Il cronoprogramma potrà essere oggetto di aggiornamento periodico in relazione all'evoluzione delle attività commissariali e agli indirizzi assunti dagli enti competenti.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti tecnici e porgo distinti saluti.

Roma, 15 ottobre 2025

Il Commissario straordinario

Prof. Ing. Stefano Orlandini

(Firma digitale apposta ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale)

Allegati:

Allegato 1 – Descrizione delle fasi del cronoprogramma delle attività commissariali

Allegato 2 – Dati finanziari riscontrabili sul Sistema di Monitoraggio MOP/BDAP

Allegato 3 – Diagramma di Gantt nei formati PDF ed Excel



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

Allegato 1 – Descrizione delle fasi del cronoprogramma delle attività commissariali

In attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e in conformità al mandato commissariale conferito con D.P.C.M. 16 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, si riporta di seguito la descrizione delle principali fasi operative previste nel cronoprogramma delle attività commissariali per la progettazione della diga di Vetto. Il cronoprogramma è inoltre rappresentato graficamente attraverso il diagramma di Gantt riportato nella Figura 1.

Fase 1 – Approvazione preliminare del DOCFAP

- **Descrizione:** Finalizzazione e approvazione preliminare del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), quale base conoscitiva e progettuale per l'avvio del Dibattito Pubblico.
- **Output atteso:** Decreto commissariale di approvazione preliminare del DOCFAP.
- **Periodo:** Entro il terzo mese, con scadenza al 16 ottobre 2025 (*milestone* M1).

Fase 2 – Dibattito Pubblico

- **Descrizione:** Svolgimento del Dibattito Pubblico ai sensi del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, inclusa la designazione di un Responsabile, la predisposizione e pubblicazione del rapporto conclusivo con le osservazioni e le proposte pervenute.
- **Output atteso:** Rapporto conclusivo del Responsabile del Dibattito Pubblico.
- **Periodo:** Il Dibattito Pubblico si svolgerà tra il quarto e il settimo mese e si concluderà entro il 31 gennaio 2026. Il rapporto conclusivo è previsto entro il 10 febbraio 2026 (*milestone* M2).

Fase 3 – Approvazione definitiva del DOCFAP

- **Descrizione:** Approvazione definitiva del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), anche in considerazione degli esiti del Dibattito Pubblico, previa acquisizione del parere tecnico non vincolante da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, quale base conoscitiva e progettuale per la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).
- **Output atteso:** Decreto commissariale di approvazione definitiva del DOCFAP.
- **Periodo:** Entro il 13 febbraio 2026 (*milestone* M3).

Fase 4 – Redazione e approvazione del DIP

- **Descrizione:** Redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) sulla base del DOCFAP approvato definitivamente, degli indirizzi commissariali e degli esiti del Dibattito Pubblico, quale atto di indirizzo per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Approvazione del DIP, previa acquisizione del parere tecnico non vincolante da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
- **Output atteso:** Decreto commissariale di approvazione del DIP.
- **Periodo:** La redazione del DIP avverrà in parallelo con il Dibattito Pubblico, tra il quarto e il settimo mese. Il decreto commissariale di approvazione del DIP è previsto entro il 16 febbraio 2026 (*milestone* M4).

Fase 5 – Accertamento della copertura finanziaria per il PFTE

- **Descrizione:** Verifica e formalizzazione delle risorse finanziarie necessarie per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).

Sede istituzionale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, 00161 Roma
Sedi di supporto amministrativo: Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42, 42121 Reggio Emilia •
Consorzio della Bonifica Parmense, Via Marco Emilio Lepido 70, 43123 Parma
Mobile: +39 331 6213086 • E-mail: stefano.orlandini@unimore.it • PEC: stefano.orlandini@pec.unimore.it



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

- **Output atteso:** Comunicazione formale di disponibilità delle risorse.
- **Periodo:** Entro il 16 febbraio 2026, quale prerequisite per l'avvio della gara d'appalto per l'affidamento del PFTE con eventuale opzione per il Progetto Esecutivo (PE).

Fase 6 – Gara d'appalto per il PFTE con eventuale opzione per il PE e redazione del PFTE

- **Descrizione:** Espletamento della procedura di gara per l'affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), con eventuale opzione per il Progetto Esecutivo (PE), e successiva redazione del PFTE.
- **Output atteso:** Contratto di affidamento e PFTE completato.
- **Periodo:** La procedura di gara sarà espletata tra l'ottavo e il decimo mese. La redazione del PFTE avverrà tra l'undicesimo e il sedicesimo mese, con conclusione prevista entro il 16 novembre 2026 (*milestone* M5).

Fase 7 – Valutazione ambientale, Conferenza dei Servizi e approvazione del PFTE

- **Descrizione:** Svolgimento dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la valutazione ambientale, e approvazione del PFTE con le eventuali prescrizioni, previa acquisizione del parere tecnico vincolante della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
- **Output atteso:** Decreto commissariale di approvazione del PFTE.
- **Periodo:** La Conferenza dei Servizi decisoria sarà convocata a valle della presentazione del PFTE e in parallelo alla conclusione della sua redazione, tra l'undicesimo e il sedicesimo mese. L'approvazione del PFTE in Conferenza è prevista tra il diciassettesimo e il diciannovesimo mese. Il decreto commissariale di approvazione del PFTE è previsto entro il 16 febbraio 2027 (*milestone* M6).

Fase 8 – Accertamento della copertura finanziaria per il PE

- **Descrizione:** Verifica e formalizzazione delle risorse finanziarie necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo (PE).
- **Output atteso:** Comunicazione formale di disponibilità delle risorse.
- **Periodo:** Entro il 16 febbraio 2027.

Fase 9 – Redazione del PE

- **Descrizione:** Redazione del Progetto Esecutivo (PE), in coerenza con le prescrizioni emerse nelle fasi autorizzative. Poiché la procedura di gara per il PFTE include l'eventuale opzione per il PE, non sarà necessaria una procedura di gara aggiuntiva.
- **Output atteso:** PE completato.
- **Periodo:** Entro il 30 giugno 2027 (*milestone* M7).

Fase 10 – Approvazione del PE


- **Descrizione:** Approvazione commissariale del Progetto Esecutivo (PE), previa acquisizione del parere tecnico vincolante da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
- **Output atteso:** Decreto commissariale di approvazione del PE.
- **Periodo:** Entro il ventiquattresimo mese, con scadenza al 16 luglio 2027 (*milestone* M8).

Sede istituzionale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, 00161 Roma
Sedi di supporto amministrativo: Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42, 42121 Reggio Emilia •
Consorzio della Bonifica Parmense, Via Marco Emilio Lepido 70, 43123 Parma
Mobile: +39 331 6213086 • E-mail: stefano.orlandini@unimore.it • PEC: stefano.orlandini@pec.unimore.it



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

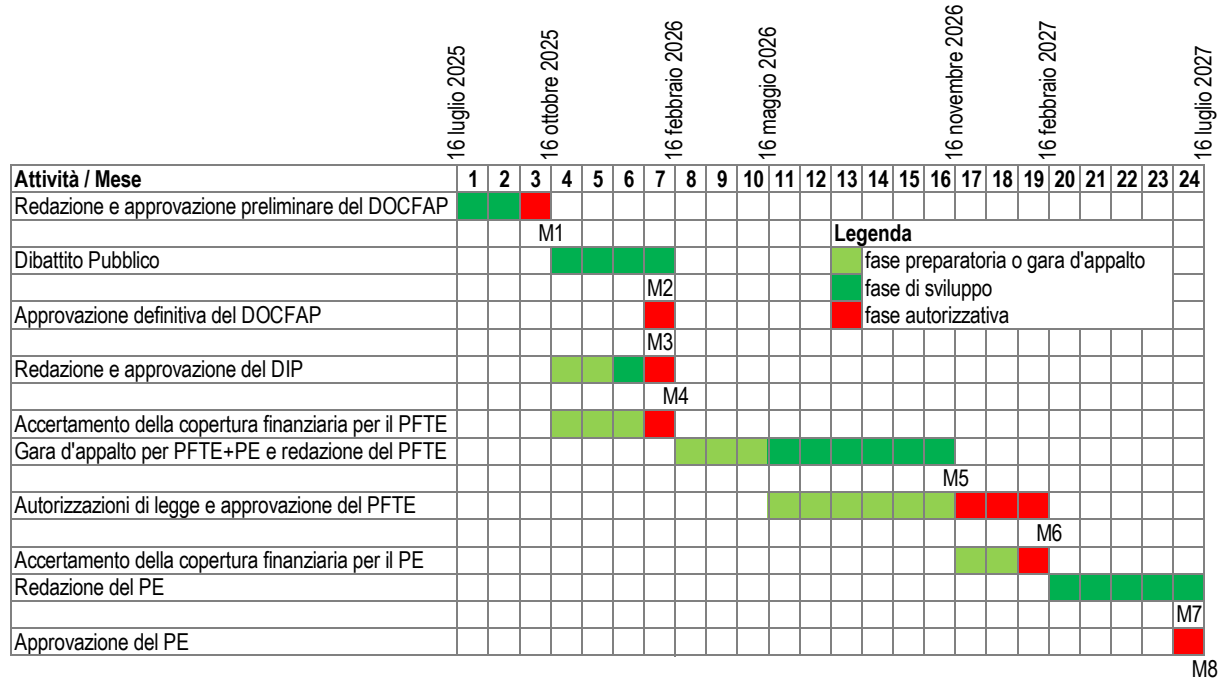

- DOCFAP = Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
- DIP = Documento di Indirizzo alla Progettazione.
- PFTE = Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
- PE = Progetto Esecutivo.
- M1 = Approvazione preliminare del DOCFAP, 16 ottobre 2025.
- M2 = Conclusione del Dibattito Pubblico, 10 febbraio 2026.
- M3 = Approvazione definitiva del DOCFAP, 13 febbraio 2026.
- M4 = Approvazione del DIP, 16 febbraio 2026.
- M5 = PFTE completato, 16 novembre 2026.
- M6 = Approvazione del PFTE, 16 febbraio 2027.
- M7 = PE completato, 30 giugno 2027.
- M8 = Approvazione del PE, 16 luglio 2027.

Figura 1. Diagramma di Gantt relativo alla progettazione della diga di Vetto (allegato in formato PDF ed Excel).



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DIGA DI VETTO

Nominato con D.P.C.M. 16 luglio 2025 ex art. 2, c. 6-septies, D.L. 208/2024 conv. L. 20/2025.

Allegato 2 – Dati finanziari riscontrabili sul Sistema di Monitoraggio MOP/BDAP

(dati aggiornati al 15 ottobre 2025)

- Costi previsti: 20.000.000 EUR per la progettazione PFTE+PE. La presente stima ha carattere meramente indicativo e potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione all'evoluzione delle scelte progettuali e all'esito di analisi economiche di maggior dettaglio.
- Costi impegnati: 3.500.000 EUR.
- Fonti di finanziamento: non ancora definite dal soggetto attuatore alla data del presente aggiornamento. L'informazione sarà aggiornata man mano che le informazioni saranno rese disponibili dal soggetto attuatore e inserite nei sistemi informativi MOP/BDAP.
- Stato di avanzamento finanziario e procedurale: in corso di definizione.
- Cronoprogramma: predisposto.
- Codici CUP: F13F22000170008.
- Codice CIG: non disponibile.

Utilizzando il portale OpenCUP (<https://www.opencup.gov.it>) per il progetto avente CUP F13F22000170008, ovvero per l'opera denominata:

REALIZZAZIONE DI UN INVASO A SCOPI PLURIMI IN AMBITO MONTANO E ALTRE AZIONI SINERGICHE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DELLA VAL D'ENZA NELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E PARMA. *VIA VARIE* REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO A SCOPI PLURIMI IN AMBITO MONTANO E ALTRE AZIONI SINERGICHE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DELLA VAL D'ENZA

si ottengono i seguenti dati:

- Totale costo previsto: 3.500.000 EUR
- Totale finanziamento pubblico previsto: 3.500.000 EUR

Sul portale OpenBDAP (<https://openbdap.rgs.mef.gov.it>) non sono state trovate informazioni specifiche. Sono in corso le procedure di abilitazione agli accessi informativi.

Sul portale del Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche, MOP (<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html>) non sono state trovate informazioni specifiche. Sono in corso le procedure di abilitazione agli accessi informativi.

I dati finanziari saranno progressivamente aggiornati in relazione alla messa a disposizione delle informazioni da parte del soggetto attuatore, con il supporto tecnico-amministrativo del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e del Consorzio della Bonifica Parmense, al fine di garantire il pieno allineamento con i sistemi informativi MOP/BDAP.

Sede istituzionale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, 00161 Roma
Sedi di supporto amministrativo: Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Corso Garibaldi 42, 42121 Reggio Emilia •
Consorzio della Bonifica Parmense, Via Marco Emilio Lepido 70, 43123 Parma
Mobile: +39 331 6213086 • E-mail: stefano.orlandini@unimore.it • PEC: stefano.orlandini@pec.unimore.it
